


# Uppsala spårväg

## Detaljplaner

- Detaljplan A–B och spårvagnsdepå
  - Antogs i KF 17 juni 2024
  - Överklagad i MMD
    - Sammanträde i mark- och miljödomstolen genomfördes 11 februari 2025
- Detaljplan Uppsala C – Mungatan och C
  - Antogs i KF 24 feb 2025
  - Överklagad i MMD
- Detaljplan D
  - Antogs i KF 27 januari 2025
  - Överklagad i MMD

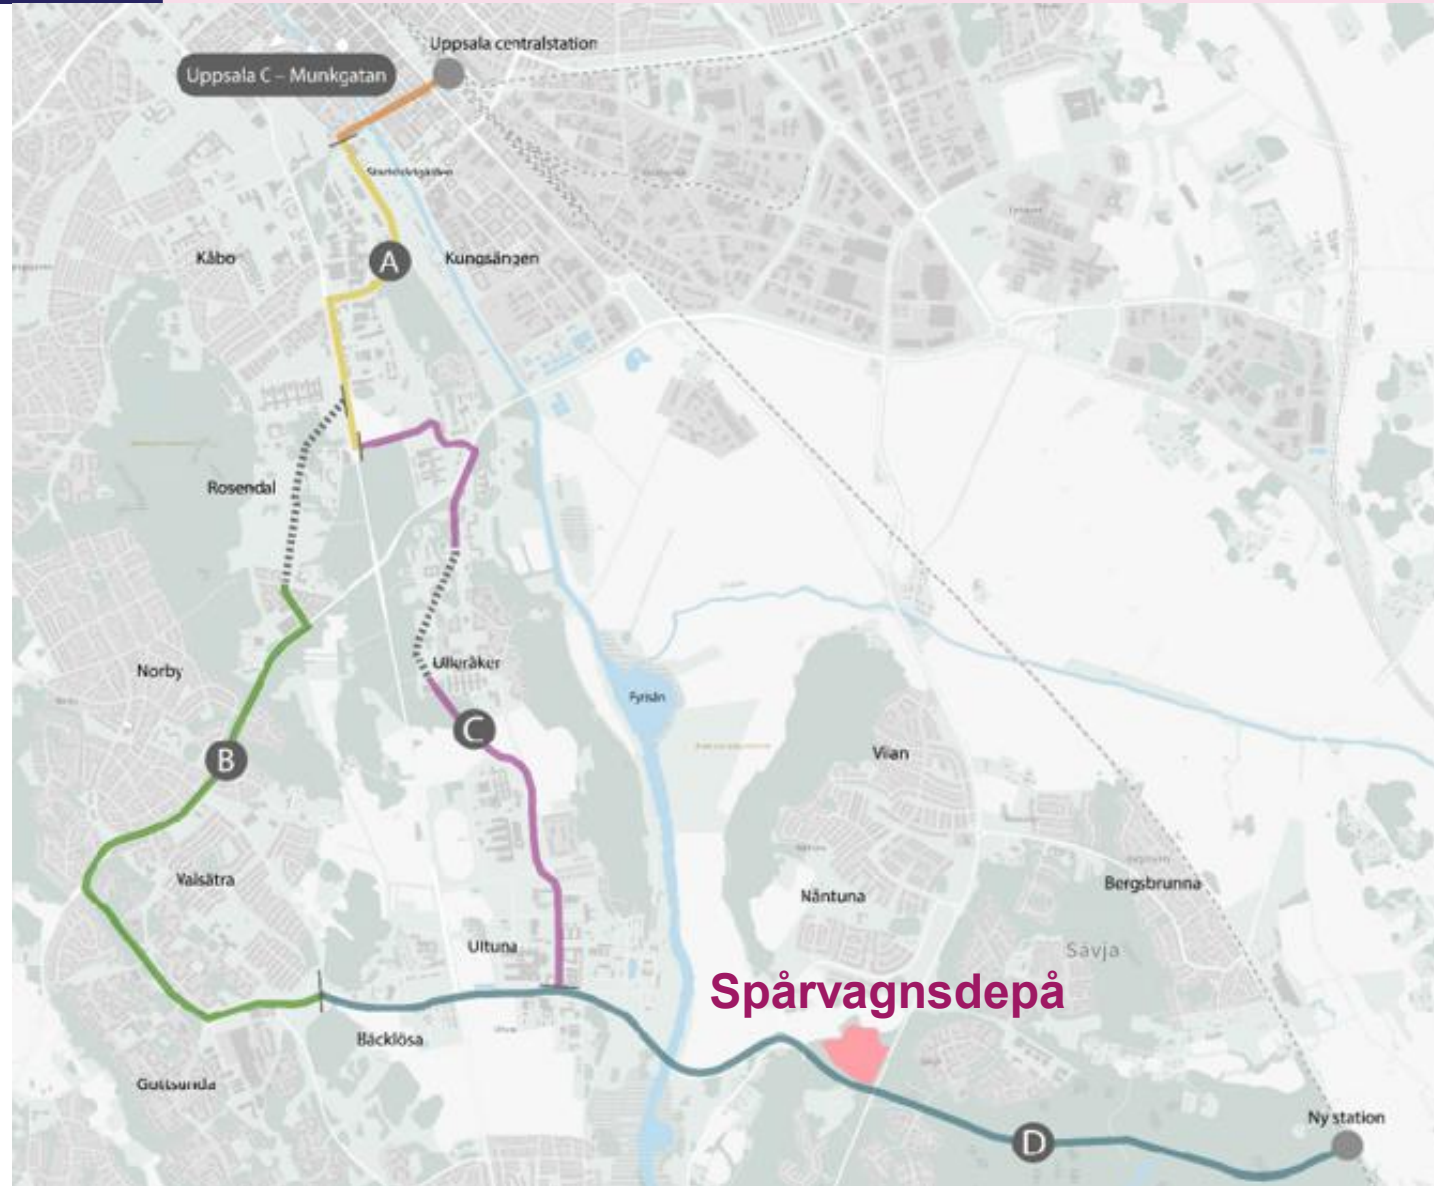

## Tillstånd, dispenser och anmälningar

- Över 30 redan godkända tillstånd, dispenser och anmälningar
- Bron över Fyrisån vid Ultuna
  - Huvudförhandling 25-26 aug 2025
  - MMD avslog ansökan 13 oktober 2025
  - Kommunen överklagade domen 3 nov 2025
  - Kommunen inkom med ett utvecklad överklagande den 15 dec 2025
- Artskyddsdispens, Cinnoberbagge
  - Länsstyrelsen meddelade dispens 23 jan 2025
  - MMD meddelade dispens 1 sep 2025
  - MÖD meddelade prövningstillstånd 21 november 2025



## Förarbeten

### Pågående entreprenader *Ledningsomläggning*


- Hugo Alfvéns väg – Q2 2026
- Skåneresan – Q2 2026
- Munkgatan – Q4 2026
- Södra Ulleråker – Q3 2027
- Rosendal – Q3 2026
- Regementsvägen – Q2 2027

### Slutförda entreprenader

- Dag H väg – nov 2025

### Kommande entreprenader *Ledningsomläggning*

- Gottsunda allé – Q1 2026 till Q2 2026
- Ultunaallén – Q2 2026 till Q3 2026
- SVA/Ulls väg – Q2 2026 till Q3 2027
- Sjukhusvägen (kulvert) – Q1 2026 till Q3 2026
- Sjukhusvägen – Q3 2026 – Q3 2027
- Vårdsätravägen – Q4 2026 – Q4 2027

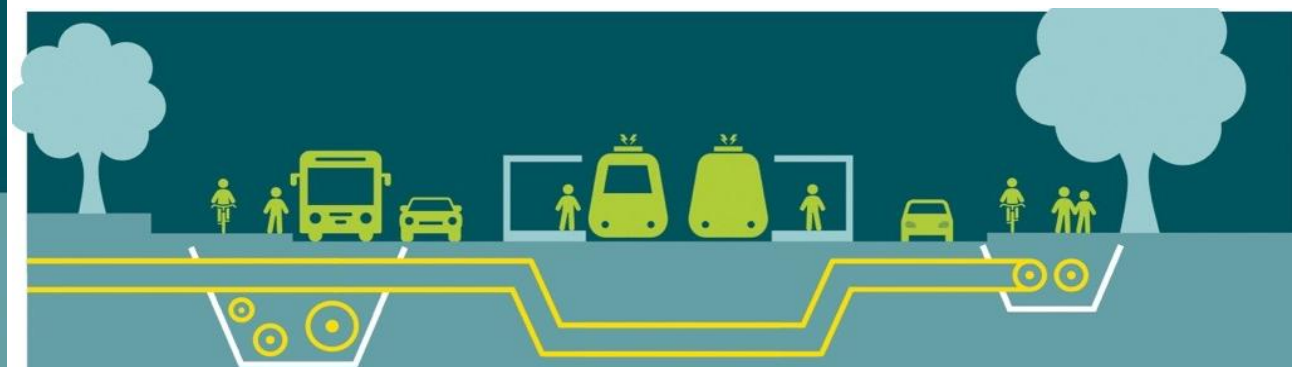


## Depå

- Beslut om projekteringen togs i regionfullmäktige 12 februari 2025.
- Bygghandlingsprojekteringen färdigställs Q1 2026.
- Byggstart inväntar laga kraft vunnen DP(MMD), artsskyddsdispens (MÖD) och bygglov (MMD).

## Fordon

- Upphandling av fordon inkl. underhållsavtal pågår.
- Tilldelning av planeras ske under juni 2026.
- Fokusgruppstudier fordon och hållplatser pågår.

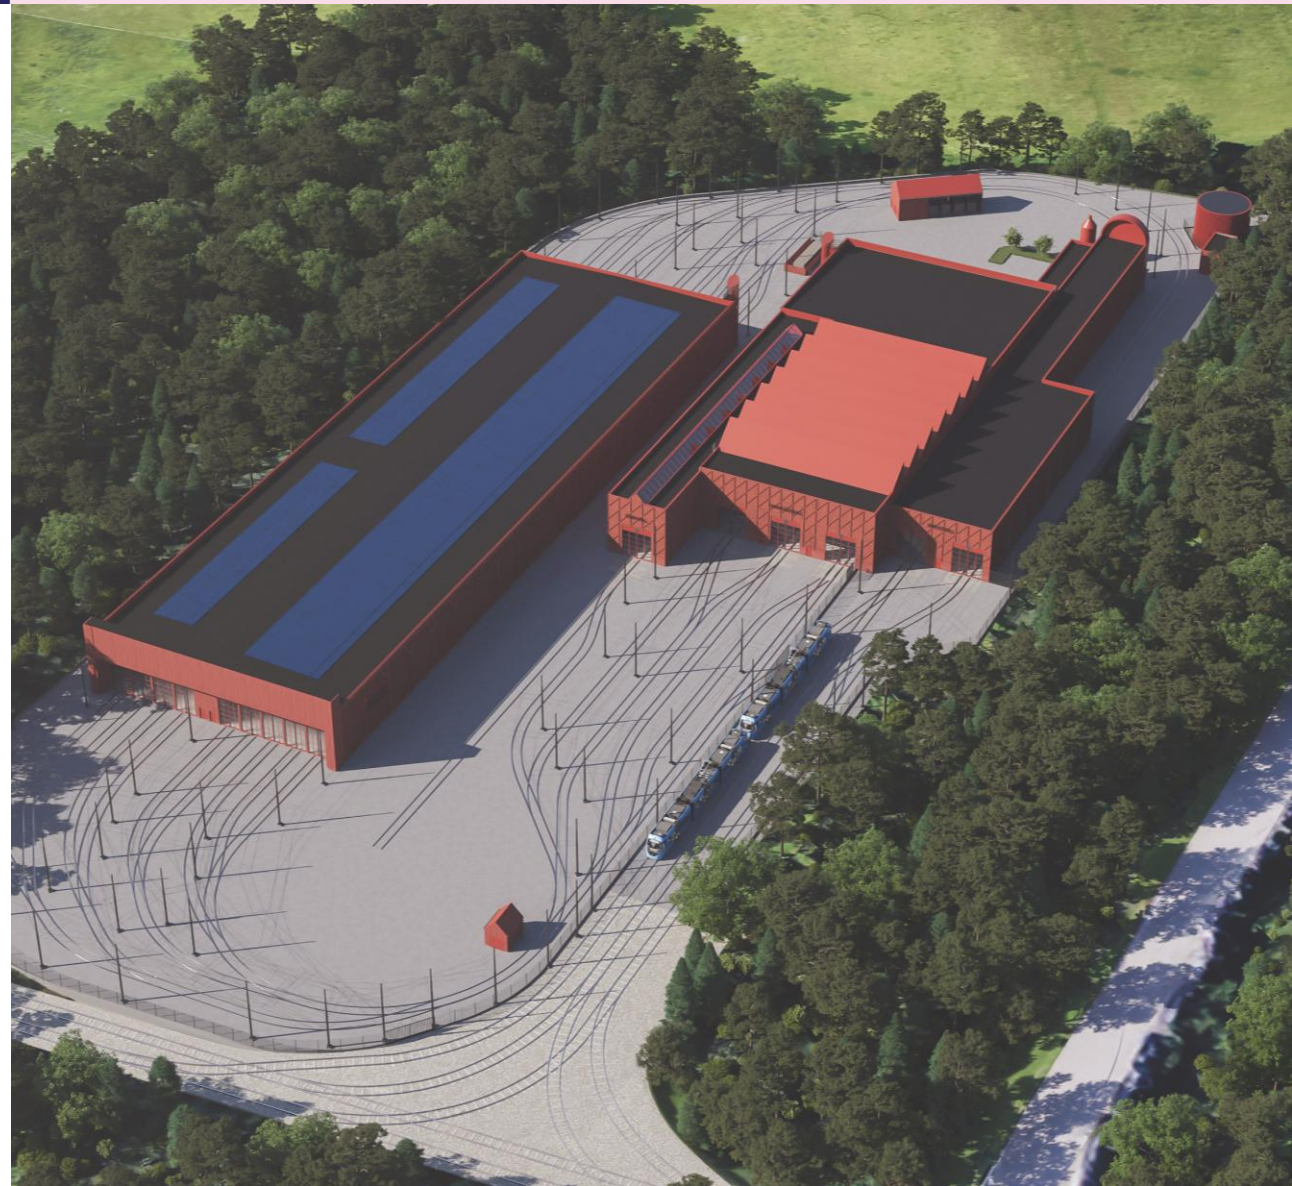

## Anläggning

- Kontraktet för entreprenaden skrevs mellan Uppsala kommun och NYAB Azvi AB.
- Systemhandlingsprojektering för spåranläggningen samt bygghandlingsprojektering för bron över Fyrisån vid Ultuna pågår (fas 1).
- Start av breddning av Gång- och cykelport på Dag Hammarskjölds väg, samt teststräckan i Ulleråker
- Fas 1 planeras färdigställas under Q3 2026 inför beslut om bygghandlingsprojekteringen (fas 2).

